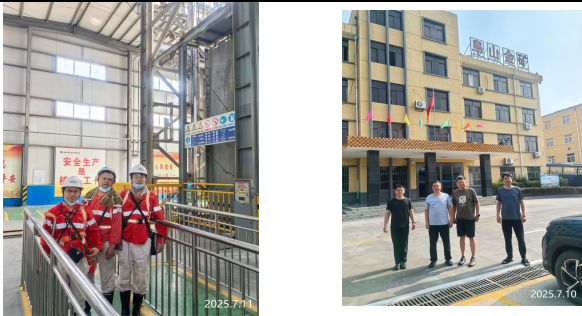
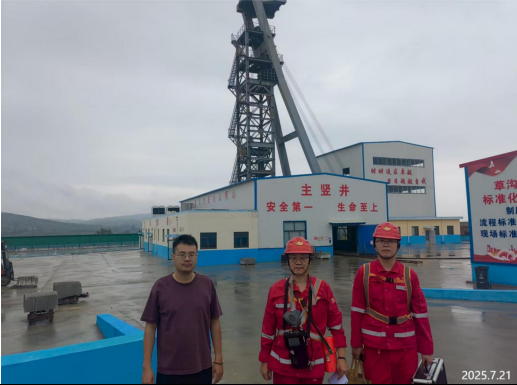


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
15	GX-B1343/21-8-25013	2025.7.18	1. 矿井总风量：9241.8m ³ /min； 2. 主通风机风量：9342.0m ³ /min； 3. 矿井有效风量：6269.2m ³ /min； 4. 矿井有效风量率：67.1%； 5. 机站风量：-560m中段通风机机站4752.0m ³ /min，-680m通风机机站4590.0m ³ /min； 6. 机站风压：-560m中段通风机机站1755Pa，-680m中段通风机机站1587Pa； 7. 矿井通风阻力：-560m中段通风机系统1692.8Pa；-680m中段通风机系统1589.7Pa。	
16	GX-B1347/21-8-25013	2025.7.18	1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：67.1%，大于60%，合格； 5、风机全压效率：74.8%，大于70%，合格； 6、风量供需比：1.49，符合 $1.32 \leq \beta \leq 1.67$ 要求，合格； 7、综合指标：89.1%，大于72%，合格。	
17	GX-B1341/24-8-25037	2025.7.18	综合判定：合格。	

18	GX-B1341/24-8-25038	2025.7.18	综合判定：合格。	
19	GX-B1343/21-8-25014	2025.7. 23	1. 矿井总进风量：2328.0m ³ /min; 2. 矿井总回风量：2437.8m ³ /min; 3. 主通风机风量：2500.2m ³ /min; 4. 矿井有效风量：2159.1m ³ /min; 5. 矿井有效风量率：86.4%; 6. 机站风量：2500.2m ³ /min; 7. 机站风压：780Pa; 8. 矿井通风阻力：782.9Pa。	
20	GX-B1347/21-8-25014	2025.7.23	1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：86.4%，大于60%，合格； 5、风机全压效率：72.6%，大于70%，合格； 6、风量供需比：1.50，符合 $1.32 \leq \beta \leq 1.67$ 要求，合格； 7、综合指标：92.5%，大于72%，合格。	

21	GX-B1341/24-8-25039	2025.7.23	综合判定：合格。	 2025.7.21
22	GX-B1371/21-8-25004	2025年7月23日	存在问题： 1、监测监控设备未定期进行调校。 2、无传感器调校记录表。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 2025.07.21
